

BYGGE NYT

UGE 35



I uge 34 kom der så spær til blok 4 og vi fik støbt de første bundplader til skure.


I næste uge 35 er planen følgende:

Der graves forsat til kloak og vand langs huse.

Papfolk starter onsdag med isolering og pap på karnap-tage.

Pro-tec facadeelementer ankommer først på ugen.

De sidste 8 karnapper skulle lande tirsdag, disse monteres løbende.

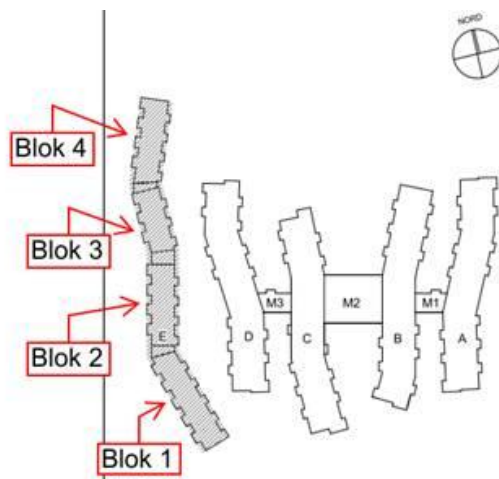

Hilsen

Martin og Susanne
