


BYGGE NYT

UGE 37



I uge 36 fik vi støbt de første badeværelsesgulve.
Spær og limtræ blev leveret til tagene imellem boligblokkene.

I denne uge er planen følgende:
Vi lukker blok 4 med undertag og lægter.
Der arbejdes videre med kloak og vand langs blok 2 og 1.
Der brændes pap på de sidste karnapper.
Blikkenslager går i gang igen med skiffertage.

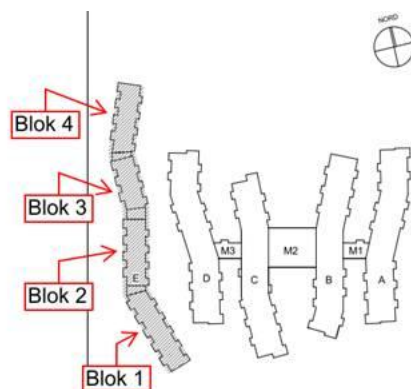

Hilsen

Martin og Susanne
