

# BYGGE NYT


## UGE 40



Uge 39 gik hovedsaglig med at grave for kabler for DONG, Dansk Kabel TV/YouSee, TDC og elektriker samt midlertidig forsyning.

I denne uge begynder vi nu så småt at dække kabler over med stenfrit materiale og efterfølgende bygge bund op til kommende asfaltvej langs blok 1-3.

Det er samtidigt planen at vi udfører en prøve-bolig med belægning på begge sider inden for en 14 dages tid.

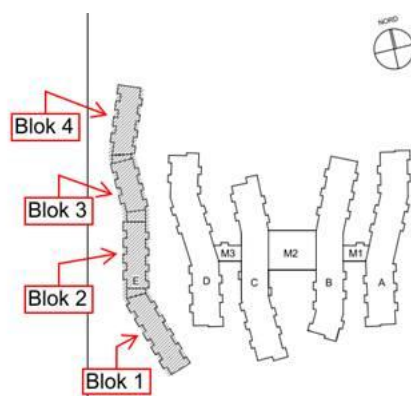

Hilsen

Martin og Susanne
