

## UGE 42




I uge 41 fik vi efter planen startet op på stål-regler til gipsvægge omkring bad og lyskasser omkring ovenlys i baderum alt imens at elektriker snart har gjort klar til at vi kan få strøm på husene, måske allerede i næste uge 42.

I dag torsdag blev der taget fugtprøver at beton-dæk som giver os et præj om hvornår vi kan ligge trægulve.

I morgen fredag kommer asfaltfolkene og udligger gab-laget langs blok 1,2 og 3.

I denne her uge fortsætter blikkenslager med tagrender og skiffer-arbejdet, og tømrerne med at "binde" tagene imellem boligblokkene sammen.

Gartner er ved at forberede en "prøve-bolig" mht. belægning på begge sider (blok 1).

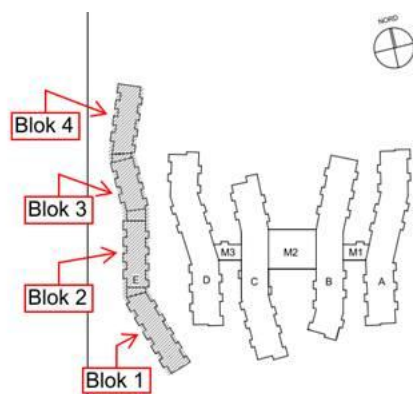

Hilsen

Martin og Susanne
