

# BYGGE NYT


## UGE 47



I uge 46 fik vi i blok 1 og 3 monteret lofter og er startet op på skydedørsvægge mellem soveværelse og stue. Udvendige er fuger om prøve vindue på blok 4 nu godkendt så vi kan få fuget de øvrige steder.

I denne uge spartles gulve i blok 1 og 3, imens arbejderne forsætter i blok 2 og 4.

Udvendigt skulle vi gerne blive færdig med prøve på belægning omkring den sydligste bolig i blok 1.

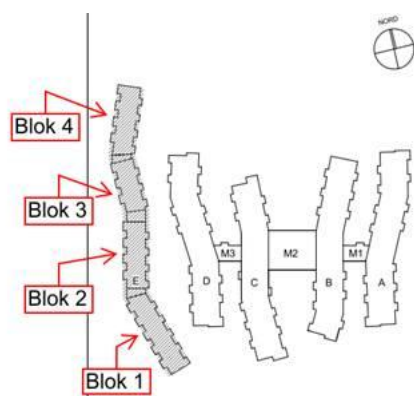

Hilsen

Martin og Susanne
