

BYGGE NYT

UGE 48




I uge 47 fik vi lavet skiffertagene færdige.
Vi har også fået alle væggene til skurene op at stå.

I denne uge starter vi op på malerarbejde og gulvarbejde i blok 1 og 3 mens vi forsøger at gøre blok 2 og 4 færdige med gips og el.

Murer er snart færdig med badeværelser i blok 1.

Udvendigt forsætter blikkenslager med tagrender og tømrer ligger tagplader på skurene.

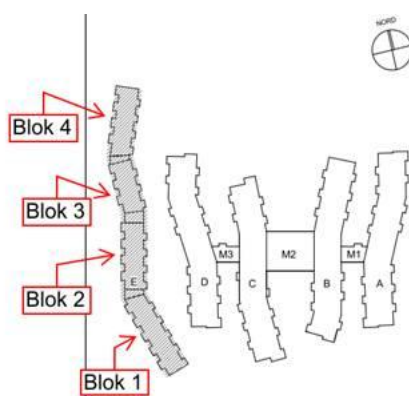

Hilsen

Martin og Susanne
